


KARTA REMONTOWA ZDARZENIA DROGOWEGO

Lokalizacja i opis zdarzenia : Droga Powiatowa nr 3315D LUDWIKOWICE


Uszkodzone podczas powodzi z września 2024r mury oporowe wraz ubytkiem w korpusie drogowym KM 0+810. Do naprawy i uzupełnienia mur oporowy , uzupełnienie korpusu drogowego .

Część graficzna

Plan sytuacyjny

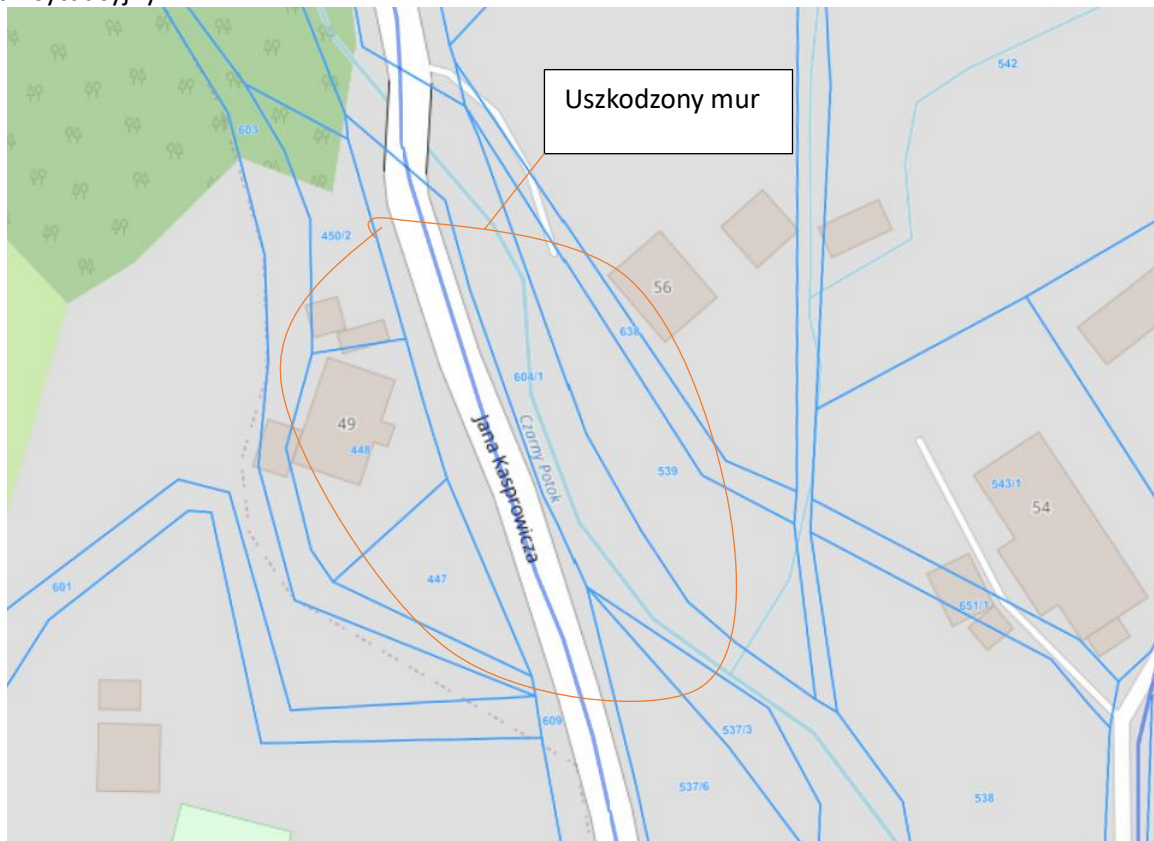

Przekroje konstrukcyjne

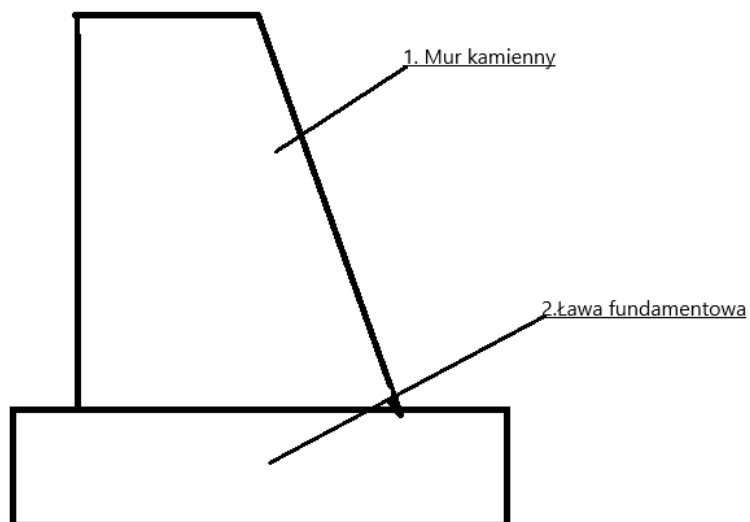

OBWÓD DROGOWY NR 3 W NOWEJ RUDZIE

Przedmiar robót

1. Roboty ziemne – wykop pod fundament muru – 75m^3 ;
2. Wykonanie betonowego fundamentu pod mur oporowy $=15\text{m}^3$;
3. Odbudowa muru oporowego kamiennego grub. 60cm
4. Uzupełnienie korpusu drogi materiałem kamiennym – 30m^3

